

СОГЛАСОВАНО:

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

В.М. Максимов

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

Л.А. Рафикова

И.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

О.С. Александрова

Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики

М.Р. Якушев

Руководитель Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам


С.Ф. Егоров

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики

С.Г. Артамонов

2026 г.

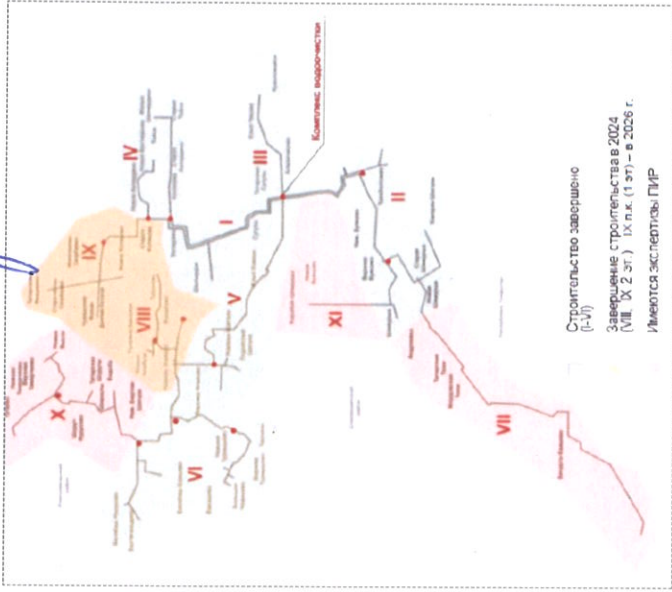

«Дорожная карта» по функционированию «Группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики» (в зоне охвата I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX пусковых комплексов БШК)

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
I. БЛОК МЕРОПРИЯТИЙ:				
ПЕРЕДАЧА В ГОС. СОБСТВЕННОСТЬ ЧР И ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА БШК (I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX ПК* группового водовода БШК)				
1.1	Подготовка документов (включая графическое описание местоположения границ публичного	01.06.2026	КУ «РСЕЗ»	

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
	сервитута), необходимых для установления публичного сервитута в соответствии с проектной и рабочей документацией			Затратное. (1,189 млн.руб. учтено при 1 уточн РБ ЧР)
1.2	Представление ходатайства об установлении публичного сервитута и полного пакета документов, предусмотренных законодательством	06.06.2026	КУ «РСЕЗ»	
1.3	Рассмотрение ходатайства об установлении публичного сервитута и представленных документов, опубликование сообщения о возможном установлении публичного сервитута, подготовка проекта решения Кабинета Министров Чувашской Республики об установлении публичного сервитута	26.06.2026	Минэкономразвития Чувашии Адм. Батыревского МО Адм. Шемуршинского МО Адм. Комсомольского МО	
1.4	Принятие решения об установлении публичного сервитута	06.07.2026	Кабинет Министров Чувашской Республики	
1.5	Выдача решения Кабинета Министров Чувашской Республики об установлении публичного сервитута	11.07.2026	Минэкономразвития Чувашии	
1.6	Постановка на баланс Минстроя Чувашии введенного объекта	13.07.2026	Минстрой Чувашии	
1.7	Представление в Минэкономразвития Чувашии документов для постановки НИ в реестр государственного имущества Чувашской Республики и регистрации права собственности Чувашской Республики в ЕГРН	27.07.2026	Минстрой Чувашии	
1.8	Регистрация права собственности Чувашской Республики в ЕГРН	07.08.2026	Минэкономразвития Чувашии	
1.9	Внесение сведений в реестр государственного имущества Чувашской Республики	12.08.2026	Минэкономразвития Чувашии	
1.10	Определение балансодержателя (пользователя) в соответствии с условиями государственного контракта	24.07.2026	Минстрой Чувашии	
1.11	Представление балансодержателем обращений в адрес Минэкономразвития Чувашии о передаче имущества	28.07.2026	ГУП «БОС»	
1.12	Представление Минстроем Чувашии в Минэкономразвития Чувашии обращения об изъятии из оперативного управления с приложением документов, установленных п.4.12 Положения об управлении и распоряжении государственной собственностью Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.03.2011 № 88 «Вопросы управления и распоряжения государственной собственностью Чувашской Республики»	14.08.2026	Минстрой Чувашии	
1.13	Рассмотрение поступивших в Минэкономразвития Чувашии документов, указанных в пунктах 1.11 и 1.12, подготовка на их основе проектов распоряжений об изъятии их из оперативного управления и закреплении в хозяйственное ведение ГУП ЧР «БОС»	21.08.2026	Минэкономразвития Чувашии	
1.14	Принятие распоряжения Минэкономразвития Чувашии, подписание и утверждение актов приема-передачи государственного имущества в хозяйственное ведение ГУП «БОС».	28.08.2026	Минэкономразвития Чувашии ГУП «БОС»	

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
II. БЛОК МЕРОПРИЯТИЙ: ПЕРЕДАЧА ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ В ГОС. СОБСТВЕННОСТЬ ЧР И ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ II ПК ГРУППОВОГО ВОДОВОДА БШК				
2.1.	Обеспечение передачи в государственную собственность Чувашской Республики объектов II пускового комплекса, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского муниципального округа, учитывая источники финансирования объекта из федерального и республиканского бюджетов в период его строительства.	30.05.2026	Минэкономразвития Чувашии Минстрой Чувашии Адм. Шемуршинского МО	
2.2.	Подписание и утверждение актов приема-передачи государственного имущества в хозяйственное ведение ГУП «БОС» II ПК.	01.06.2026	Минэкономразвития Чувашии ГУП «БОС»	
III. БЛОК МЕРОПРИЯТИЙ: ПОДАЧА ВОДЫ КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ I, II ПК ГРУППОВОГО ВОДОВОДА БШК				
1. Оценка необходимых объемов работ на I, II ПК (водоводы, НСП №№13, 14, НС 2 подъема на I ПК, на II ПК				
3.1	Совместный технический осмотр насосных станций I и II ПК с оценкой технического состояния.	30.04.2026	ГУП «БОС» Адм. Шемуршинского МО Адм. Батыревского МО КУ ЧР «РСЕЗ»	
3.2	Результат: составление ведомостей объемов работ (ВОР) для капитального ремонта. Совместный технический осмотр элементов водоводов I и II ПК (колодцы, запорная арматура) Результат: составление ведомостей объемов работ (ВОР) для ремонта водоводов с колодцами и запорной арматурой и определение возможности подключения населенных пунктов	30.04.2026	ГУП «БОС» Адм. Шемуршинского МО Адм. Батыревского МО КУ ЧР «РСЕЗ»	
3.3	Получение технических условий и заключение договора для технологического присоединения к сетям электроснабжения II ПК	01.05.2026	Адм. Шемуршинского МО Минпромэнерго ЧР (в части взаимодействия с ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»)	
3.4	Расчет сметной стоимости на КР насосных станций I и II ПК	30.05.2026	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС»	
	Расчет сметной стоимости на КР водоводов I и II ПК.	30.05.2026		
	Расчет сметной стоимости на автоматизации и диспетчеризации с видеонаблюдением территории и помещений НС II ПК.	30.05.2026		
	Расчет сметной стоимости на диспетчеризацию НС I ПК.	30.05.2026		
3.5	Экспертиза сметной стоимости на КР насосных станций I и II ПК.	15.06.2026	ГУП «БОС» - направление материалов АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в	
	Экспертиза сметной стоимости на КР водоводов I и II ПК.	15.06.2026		
	Экспертиза сметной стоимости работ по автоматизации и диспетчеризации с	15.06.2026		

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
	видеонаблюдением территории и помещений НС II ПК.		строительстве ЧР»	
	Экспертиза сметной стоимости работ по диспетчеризации НС I ПК.	15.06.2026		
3.6	Решение вопроса по финансированию в зависимости от стадии бюджетного цикла – резервный фонд КМ ЧР, уточнение РБ ЧР (Субсидия ГУП «БОС»)	10.07.2026	ГУП «БОС» - формирование пакета документов в составе предложений Минстрой Чувашии – администрирование, взаимодействие с Минфином Чувашии	Затратное. Предварительная стоимость направлена в Минфин Чувашии 05.03.2026 от ГУП «БОС» (п. 2.5 Перечня поручений от 26.02.2026) - 144,1 млн. руб.
2. Закупочные процедуры, проведение работ на I, II ПК (водоводы, НСП №№13, 14, НС 2 подъема на I ПК, на II ПК)				
3.7	Проведение закупочных процедур на КР насосных станций I и II ПК.	30.06.2026	ГУП «БОС»	
	Проведение закупочных процедур на КР водоводов I и II ПК.	30.06.2026		
	Проведение закупочных процедур на КР водоводов I ПК.	30.08.2026		
	Проведение закупочных процедур на выполнение работ по автоматизации НС II ПК.	30.06.2026		
	Проведение закупочных процедур на выполнение работ по диспетчеризации НС I ПК.	15.08.2026		
3.8	Заключение договора на КР насосных станций I и II ПК.	15.07.2026	ГУП «БОС» - заказчик	
	Заключение договора на КР водоводов I и II ПК.	15.07.2026		
	Заключение договора на КР водоводов I ПК.	15.09.2026		
	Заключение договора на выполнение работ по автоматизации и диспетчеризации с видеонаблюдением территории и помещений НС II ПК.	15.07.2026		
	Заключение договора на выполнение работ по диспетчеризации НС I ПК.	30.08.2026		
3.9	Проведение работ по договору на КР водоводов I и II ПК:			
3.9.1	(Ремонт колодцев, капитальный ремонт водовода, промывка и дезинфекция сетей)	30.11.2026	ГУП «БОС» - заказчик Подрядная организация	
3.9.2	Гидравлическая опрессовка сетей от Комплекса водозаборных сооружений до "Насосная станция 2-го подъема" II ПК	15.06.2026		
3.9.3	Гидравлическая опрессовка сетей до с. Шемурша II ПК	30.11.2026		

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
3.9.4	Гидравлическая опрессовка сетей от Комплекса водозаборных сооружений до "Насосная станция 2-го подъема" I ПК	15.08.2026		
3.9.5	Гидравлическая опрессовка сетей, до с. Батырево и с. Шыгырдан I ПК	30.09.2026		
3.10	Проведение работ по договору на КР насосных станций I и II ПК (НСП №№ 13, 14, НС 2 подъема на I ПК, НС 2 подъема на II ПК)			
3.10.1	Выполнение работ по КР НС 2 подъема II ПК	30.10.2026	ГУП «БОС» - заказчик Подрядная организация	
3.10.2	Выполнение работ по КР НСП №№ 13 II ПК	15.11.2026		
3.10.3	Выполнение работ по КР НСП №№ 14 II ПК	30.11.2026		
3.10.4	Устранение замечаний (при наличии) после совместного осмотра НС 2 подъема I ПК	30.11.2026	КУ ЧР «РСЕЗ» Подрядная организация выполнявшая работы по I ПК в рамках гарантирующих обязательств. ГУП «БОС»	
3.11	Выполнение работ по договору автоматизации и диспетчеризации с видеонаблюдением территории и помещений НС II ПК.	30.11.2026	ГУП «БОС» - заказчик Подрядная организация	
3.12	Выполнение работ по договору диспетчеризация НС I ПК.	15.11.2026	ГУП «БОС» - заказчик Подрядная организация	
3.13	Подача комплекта документов о выделении средств республиканского бюджета Чувашской республики на проектирование внутрипоселковых сетей	15.04.2026	Адм. Шемуршинского МО Адм. Батыревского МО	
3.14	Завершение работ по ремонту сетей водоснабжения в с. Шемурша.	30.11.2026	Администрация Шемуршинского МО	
3.15	Завершение работ по строительству объекта строительства внутрипоселковых сетей « Водоснабжение восточной части с. Батырево Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»	01.11.2026	КУ ЧР «РСЕЗ»	Затратное. ФП «МКИ»
3.16	Завершение работ по присоединению существующих сетей с. Батырево (ПИР и СМР)	30.11.2026	Адм. Батыревского МО КУ ЧР «РСЕЗ»	
3.17	Пуско-наладочные работы Объектов I и II пусковых комплексов	30.11.2026	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС» Адм. Батыревского МО Адм. Шемуршинского МО	
3.18	Подача хозяйственно-питьевой воды потенциальным потребителям I и II ПК (с. Шемурша, с. Батырево)	01.12.2026	ГУП «БОС» Адм. Батыревского МО Адм. Шемуршинского МО	

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
IV. БЛОК МЕРОПРИЯТИЙ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГУП «БОС» ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА БШК				
4.1	Расчет оценочного размера тарифа на питьевую воду для потребителей населенных пунктов с учетом различных вариантов расчета налогов на имущество, размеры водопотребление, иных возможных вариантов	20.03.2026	Госслужба Чувашии по тарифам ГУП «БОС»	Выполнено. Минимальный оценочный тариф – 207,3 руб./куб. м с НДС
4.2	Оценка фин. результата деятельности ГУП «БОС» при эксплуатации группового водовода БШК с учетом оценочного размера тарифа	30.04.2026	ГУП «БОС»	
4.3	Формирование, реализация предложений по обеспечению безубыточности функционирования ГУП ЧР «БОС», включая рассмотрение возможности субсидирования экономически обоснованных расходов по эксплуатации группового водовода БШК/ установление льготных тарифов на питьевую воду.	30.05.2026	ГУП ЧР «БОС» (формирование предложений) Минстрой Чувашии (администрирование, взаимодействие с Минфином Чувашии, Госслужбой Чувашии по тарифам)	Затратное.
4.4	Направление в Госслужбу по тарифам предложения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) потребителям I и II ПК	01.10.2026	ГУП «БОС»	
4.5	Установление тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) потребителям I и II ПК	15.11.2026	Госслужба Чувашии по тарифам	
V. БЛОК МЕРОПРИЯТИЙ: ПУСКО-НАЛАДКА НА КОМПЛЕКСЕ ВОДОЗАБОРНЫХ И ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА БШК (ДАЛЕЕ-КОМПЛЕКС)				
5.1	Подготовка, направление в Минстрой Чувашии для дальнейшего направления в Минфин Чувашии пакета документов для «разблокировки» лимитов, предусмотренных на субсидию ГУП «БОС»	10.04.2026	ГУП «БОС»	Затратное. В рамках 1 уточнения РБ ЧР предусмотрено 109,1 млн. руб. на фин. обеспечение затрат ГУП «БОС», связанных с эксплуатацией комплекса водозаборных и водоочистных сооружений БШК
5.2	Получение подтверждения от Минфина Чувашии о «разблокировке лимитов» при полноте обоснований (лимиты уменьшены в полном объеме до представления обоснованных расчетов и коммерческих предложений, а также анализа расчета трудозатрат на одного специалиста, с учетом возможности перераспределения нанимаемого штата).	17.04.2026	ГУП «БОС» Минстрой Чувашии Минфин Чувашии	
5.3	Заключение соглашения на предоставление субсидии (ГУП «БОС» с Минстроем Чувашии).	20.04.2026	ГУП «БОС» Минстрой Чувашии	
5.4	Восстановление работоспособности ключевых элементов тех. процесса достижения параметров воды питьевого качества:	20.11.2026	ГУП «БОС»	
5.4.1	Группа фильтров грубой очистки	30.08.2026	ГУП «БОС»	
5.4.2	Контактный осветлитель	30.09.2026	ГУП «БОС»	

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
5.4.3	Автоматизированная система оперативного управления тех. процессом	15.11.2026	ГУП «БОС»	
5.5	Проведение ПНР с достижением параметров воды хоз.-питьевой воды и 30% от проектной мощности.	20.11.2026	ГУП «БОС»	
5.6	Осуществление присоединения энергопринимающих устройств в связи с увеличением мощности объекта водоснабжения Комплекса (строительство второй линии электропередачи для обеспечения надежности электроснабжения Комплекса согласно проекта).			
5.6.1	Подача заявки на технологическое присоединение к сетям электроснабжения Комплекса на дополнительную мощность (1421,1 кВт) согласно проекту	01.11.2025	ГУП «БОС»	
5.6.2	Получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения и стоимости мероприятий по технологическому присоединению в зоне ответственности Филиал ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»	30.04.2026	ГУП «БОС» - заявитель Минпромэнерго ЧР (в части взаимодействия с ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»)	
5.6.3	Определение стоимости выполнения мероприятий по технологическому присоединению в зоне ответственности ГУП «БОС»	30.05.2026	ГУП «БОС»	
5.6.4	Решение вопроса по финансированию в зависимости от стадии бюджетного цикла – резервный фонд КМ ЧР, уточнение РБ ЧР (Субсидия ГУП «БОС»)	10.07.2026	ГУП «БОС» - формирование пакета документов в составе предложений Минстрой Чувашии – администрирование, взаимодействие с Минфином Чувашии	Затратное.
5.6.5	Заключение договора технологического присоединения сетей для электроснабжения Комплекса	30.07.2026	ГУП «БОС» - заказчик Минпромэнерго ЧР (в части взаимодействия с ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»)	
5.6.6	Выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения Комплекса	30.11.2026		
5.6.7	Выполнение технологического присоединения со стороны Заявителя ГУП «БОС»	30.11.2026	ГУП «БОС»	
VI. БЛОК МЕРОПРИЯТИЙ: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАБОР, СБОС И ОТПУСК ВОДЫ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА				
6.1	Получение разрешительной документации на отпуск воды питьевого качества.	20.09.2026	ГУП «БОС» Роспотребнадзор	
6.2	Подготовка пакета документов, заявления о предоставлении водного объекта в пользование для забора водных ресурсов	30.09.2026	ГУП «БОС»	
6.3	Подготовка пакета документов, заявления о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод	30.09.2026	ГУП «БОС»	

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
6.4	Заключение договора водопользования на основании заявления от эксплуатирующей организации (ГУП ЧР «БОС»).	30.10.2026	Минприроды Чувашии, ГУП «БОС» (стороны договора) Адм. Шемуршинского МО, Роспотребнадзор (согласование договора)	
6.5	Выдача решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод, на основании заявления от эксплуатирующей организации (ГУП ЧР «БОС»).	30.10.2026	Минприроды Чувашии Адм. Шемуршинского МО (согласование)	
6.6	Регистрация договора водопользования в государственном водном реестре	05.11.2026	Отдел водных ресурсов по ЧР Верхне-Волжского БВУ	
6.7	Регистрация решения о предоставлении водного объекта в пользование в государственном водном реестре.	05.11.2026	Отдел водных ресурсов по ЧР Верхне-Волжского БВУ	
VII. БЛОК МЕРОПРИЯТИЙ:				
ПОДГОТОВКА III, IV, V, VI, VIII, IX ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ К ПОДАЧЕ ВОДЫ				
7.1	Совместный технический осмотр насосных станций III, IV, V, VI, VIII, IX ПК с оценкой технического состояния.			
7.1.1.	Совместный технический осмотр насосных станций IV ПК.	15.07.2026	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС» Адм. Батыревского МО	
7.1.2.	Совместный технический осмотр насосных станций IX ПК.	20.07.2026	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС» Адм. Батыревского МО Адм. Комсомольского МО	
7.1.3.	Совместный технический осмотр насосных станций V, VI, VIII ПК.	25.07.2026	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС» Адм. Батыревского МО Адм. Шемуршинского МО	
7.2.	Совместный технический осмотр элементов водоводов III, IV, V, VI, VIII, IX ПК (колодцы, запорная арматура)			
7.2.1	Совместный технический осмотр водоводов III ПК.	01.07.2026	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС»	
7.2.2	Совместный технический осмотр водоводов IV ПК.	15.07.2026	Адм. Батыревского МО	
7.2.3	Совместный технический осмотр водоводов IX ПК.	30.07.2026	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС» Адм. Батыревского МО Адм. Комсомольского МО	
7.2.4	Совместный технический осмотр водоводов V, VI, VIII ПК.	30.10.2026	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС» Адм. Батыревского МО	

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
			Адм. Шемуршинского МО Адм. Комсомольского МО	
7.3	Гидравлическая опрессовка, промывка, дезинфекция сетей и ремонт колодцев III, IV, V, VI, VIII, IX пусковых комплексов			
7.3.1	Гидравлическая опрессовка, промывка, дезинфекция сетей и ремонт колодцев III ПК	30.05.2027	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС»	
7.3.2	Гидравлическая опрессовка, промывка, дезинфекция сетей и ремонт колодцев IV ПК	30.07.2027	Адм. Батыревского МО	
7.3.3	Гидравлическая опрессовка, промывка, дезинфекция сетей и ремонт колодцев IX ПК.	30.08.2027	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС» Адм. Батыревского МО Адм. Комсомольского МО	
7.3.4	Гидравлическая опрессовка, промывка, дезинфекция сетей и ремонт колодцев V, VI, VIII, ПК.	30.10.2027	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС» Адм. Батыревского МО Адм. Шемуршинского МО Адм. Комсомольского МО	
7.4	Проверка работоспособности насосных станций, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды III, IV, V, VI, VIII, IX пусковых комплексов			
7.4.1	Проверка работоспособности насосных станций, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды IV ПК	30.06.2027	ГУП «БОС»	
7.4.2	Проверка работоспособности насосных станций, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды IX ПК.	30.07.2027	ГУП «БОС»	
7.4.3	Проверка работоспособности насосных станций, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды V, VI, VIII, пусковых комплексов.	30.10.2027	ГУП «БОС»	
7.5	Создание диспетчеризации (АСОДУ) с видеонаблюдением территории и помещений объектов III, IV, V, VI, VIII, IX пусковых комплексов			
7.5.1	Расчет сметной стоимости на диспетчеризацию НС III, IV, V, VI, VIII, IX ПК	01.09.2026	КУ ЧР «РСЕЗ» ГУП «БОС»	
7.5.2	Экспертиза сметной стоимости на диспетчеризацию НС III, IV, V, VI, VIII, IX ПК	20.10.2026	ГУП «БОС» - направление материалов АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР»	
7.5.3	Решение вопроса по финансированию в зависимости от стадии бюджетного цикла – резервный фонд КМ ЧР, уточнение РБ ЧР (Субсидия ГУП «БОС»)	31.12.2026	ГУП «БОС» - формирование пакета документов в составе предложений Минстрой Чувашии – администрирование,	Затратное.

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
			взаимодействие с Минфином Чувашии	
7.5.4	Проведение закупочных процедур на выполнение работ по диспетчеризации НС III, IV, V, VI, VIII, IX ПК	30.04.2027	ГУП «БОС» - заказчик	
7.5.5	Заключение договора на выполнение работ по диспетчеризации НС III, IV, V, VI, VIII, IX ПК.	30.05.2027	ГУП «БОС» - заказчик	
7.5.6	Создание диспетчеризации (АСОДУ) с видеонаблюдением территории и помещений объектов III ПК	30.08.2027	ГУП «БОС» Подрядная организация	
7.5.7	Создание диспетчеризации (АСОДУ) с видеонаблюдением территории и помещений объектов IV ПК	30.09.2027		
7.5.8	Создание диспетчеризации (АСОДУ) с видеонаблюдением территории и помещений объектов IX ПК.	30.10.2027		
7.5.9	Создание диспетчеризации (АСОДУ) с видеонаблюдением территории и помещений объектов V, VI, VIII, ПК.	30.11.2027		
7.6	Выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов III, IV, V, VI, VIII, IX пусковых комплексов			
7.6.1	Подача заявки на технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов I, III, IV, V, VI, VIII, IX ПК	15.08.2026	ГУП «БОС»	
7.6.2	Получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения и заключение договора объектов I, III, IV, V, VI, VIII, IX ПК.	30.09.2026	ГУП «БОС»	
7.6.3	Решение вопроса по финансированию в зависимости от стадии бюджетного цикла – резервный фонд КМ ЧР, уточнение РБ ЧР (Субсидия ГУП «БОС»)	10.10.2026	ГУП «БОС» - формирование пакета документов в составе предложений Минстрой Чувашии – администрирование, взаимодействие с Минфином Чувашии	Затратное.
7.6.4	Выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов I ПК.	15.11.2026	ГУП «БОС» - заказчик Минпромэнерго ЧР (в части взаимодействия с ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»)	
7.6.5	Выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов III ПК.	30.05.2027		
7.6.6	Выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов IV ПК.	30.07.2027		
7.6.7	Выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов IX ПК.	30.08.2027		

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
7.6.8	Выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов V, VI, VII, VIII, ПК.	30.10.2027		
7.7	Завершение строительства объекта IX ПК 1 этап.	01.06.2026	КУ «РСЕЗ»	Затратное. ФП «МКИ»
7.8	Проведение пусконаладочных работ III, IV, V, VI, VII, IX ПК.	30.11.2027	ГУП «БОС» Адм. Батыревского МО Адм. Комсомольского МО	
VIII. БЛОК МЕРОПРИЯТИЙ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ				
8.1	Направление в Минстрой ЧР материалов с заявкой о выделении средств республиканского бюджета Чувашской республики на проектирование внутрипоселковых сетей, вынесение материалов на Штаб по строительству.	15.04.2026 (проекты первого приоритета)	Адм. Шемуршинского МО Адм. Батыревского МО	
8.2	Разработка проектов на строительство внутрипоселковых сетей (с учетом ранее определенного ранжирования первоочередности населенных пунктов в зоне охвата БШК)	01.07.2026 (проекты 1 приоритета)	КУ ЧР «РСЕЗ»	Затратное. РБ ЧР – в рамках общей статьи на ПИР
8.3	Направление в Минстрой ЧР материалов с заявкой о выделении средств республиканского бюджета Чувашской республики на проектирование внутрипоселковых сетей, вынесение материалов на Штаб по строительству.	15.05.2026 (проекты 2 приоритета)	Адм. Шемуршинского МО Адм. Батыревского МО	
8.4	Направление заявки на финансирование в рамках ФП «МКИ» (направление – поручение Президента РФ от 22.02.2024 № Пр-352). Предварительный ежегодный лимит – 505,5 млн. руб./ежегодно.	В рамках заявочной кампании в ФП «МКИ»	Минстрой Чувашии	
8.5	Завершение строительства внутрипоселковых сетей с. Шыгырдан Батыревского МО (от IV ПК)	01.09.2027	КУ ЧР «РСЕЗ»	Затратное. ФП «МКИ»
8.6	Строительство внутрипоселковых распределительных сетей.	2027-2030	КУ ЧР «РСЕЗ» Адм. Шемуршинского МО Адм. Батыревского МО Адм. Комсомольского МО	Затратное. ФП «МКИ»/местный бюджет
8.7	Подключение потенциальных абонентов к БШК.	2027-2030	Адм. Шемуршинского МО Адм. Батыревского МО Адм. Комсомольского МО ГУП «БОС»	
IX. БЛОК МЕРОПРИЯТИЙ: ОЦЕНКА ВОДНОГО БАЛАНСА ШЕМУРШИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА				
9.1	Предоставление информации с оценкой водного баланса Шемуршинского водохранилища, учитывающая квоту забора (изъятия) водных ресурсов, давность строительства объекта и отчета ООО «ВТ Эксперт».	15.04.2026	Минприроды Чувашии	
9.2	Формирование и направление в Минприроды Чувашии экспертного мнения двух центров компетенций в ЧР – АО «Водоканал», ГУП «БОС» по оценке наличия или отсутствия рисков функционирования водохранилища с учетом выполнения работ по заполнению водовода и резервуаров чистой воды (опрессовка, промывка, дезинфекция), а также подачи воды потребителям.	20.04.2026	ГУП «БОС» АО «Водоканал»	

п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Отнесение мероприятий к затратным / Примечание
9.3	Формирование позиции Минприроды Чувашии по оценке наличия или отсутствия рисков функционирования водохранилища с учетом выполнения работ по заполнению водовода и резервуаров чистой воды (опрессовка, промывка, дезинфекция), а также подачи воды потребителям.	30.04.2026	Минприроды Чувашии	
9.4	Формирование предложений по снятию рисков (в случае их наличия) функционирования водохранилища с учетом планируемого водоразбора.	01.05.2026	Минприроды Чувашии ГУП «БОС»	

Принятые сокращения:

ПК – пусковой комплекс

БШК – групповой водовод Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики

КР – капитальный ремонт

Комплекс – Комплекс водозаборных и водоочистных сооружений групповой водовода БШК

КУ ЧР «РЭСЗ» - КУ Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министра Чувашии

ГУП «БОС» - ГУП Чувашской Республики «БОС» Министра Чувашии

И.о. директора ГУП Чувашской Республики

«БОС» Министра Чувашии

С.Г. Николаев

И.о. директора КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»

Министра Чувашии

В.В. Разумов

Глава Шемуршинского муниципального округа

С.А. Галкин

Врио Главы Батыревского муниципального округа

Р.Ф. Ямалетдинов

Глава Комсомольского муниципального округа

Н.Н. Раськин



ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
КОМСОМОЛЬСКИ
МУНИЦИПАЛЛА ОКРУГĖН
АДМИНИСТРАЦИЙĖ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

429140, Чувашская Республика, Комсомольский район,
с. Комсомольское, ул. Заводская, 57
тел.: (8-83539) 5-12-05
E-mail: komsml@cap.ru
ИНН 2100002781, КПП 210001001,
ОГРН 1222100009240, ОКПО 78588388

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

01.04.2026 № 13/12-1459

Администрация Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, на Ваш запрос от 26.03.2026 №20/09-3990, сообщает о рассмотрении разработанной сводной «дорожной карты» по функционированию всего группового водовода Батыревского, Шемуршинского, Комсомольского районов Чувашской Республики.

Замечаний и предложений по корректировке сводной «дорожной карты», не имеется.

Глава Комсомольского
муниципального округа



Н.Н. Раськин
