


3. О ходе исполнения контрактов по зимнему содержанию дорог. О задачах по приведению дорог в нормативное состояние


Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального района составляет 291,4 километра. Из них: 16 км – дорога федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск», 23,1 км – дорога республиканского значения «Шемурша – Сойгино – Алтышево – «Аниш», 252,3 км – дороги местного значения.



- На содержание дорог вне границ населенных пунктов на 2023 год заключен контракт на сумму 10 063, 1 тыс. рублей. Срок действия – до 31.12.2023г. Кассовое исполнение за 11 месяцев составляет 7 701,1 тыс. рублей. Подрядная организация – ИП Сапруков Д.Н.
- Для выполнения работ задействовано 2 а/м КамАЗ (КДМ), 1 автогрейдер, 2 трактора МТЗ.

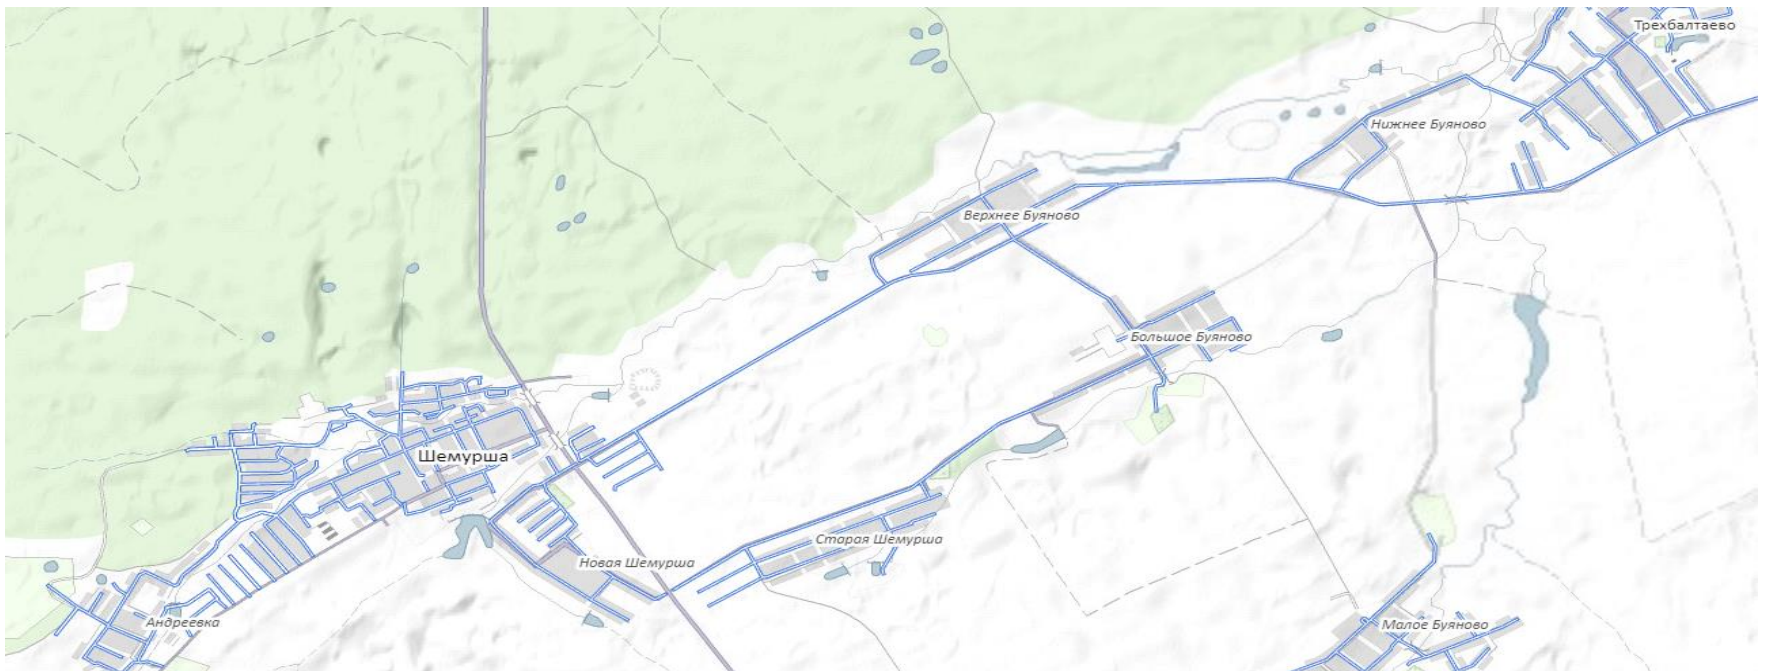

- В рамках зимнего содержания дорог вне границ населенных пунктов выполняются работы по очистке снега с проезжей части дорог, очистка от снега обочин дорог, очистка остановочных павильонов, распределение песчано-соляной смеси на проезжей части.
- А/д с интенсивностью движения транспорта менее 1500 автомобилей в сутки содержатся под уплотненным снежным покровом (УСП).

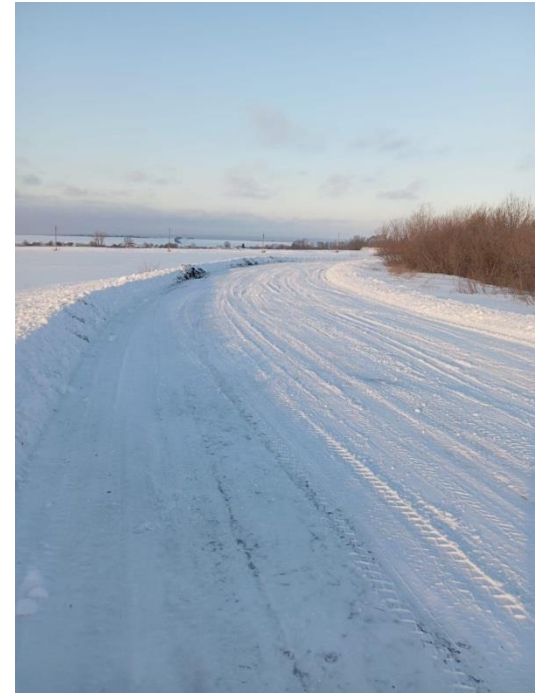

- Контрактом предусмотрено приготовление песчано-соляной смеси с содержанием твердого противогололедного материала в 10%, по заключению лаборатории КУ «Чувашупрдор» от 1.12.2023г. содержание твердого противогололедного материала в отборах песчано-соляной смеси составляет 12,8 %. На сегодняшний день израсходовано песчано-соляной смеси 142 тонн.




- На зимнее содержание дорог в границах населенных пунктов на 2023-2024гг. заключены договора и муниципальные контракты с ИП, КФХ осуществляющими свою деятельность в сельских поселениях. Сроки выполнения работ : ноябрь 2023г. – октябрь 2024г. Ведется очистка проезжей части и обочин улично-дорожной сети населенных пунктов.
- Для выполнения работ привлечено 14 единиц техники: 4 трактора Т-150, 9 тракторов МТЗ, 1 бульдозер.




- Протяженность дорог местного значения вне границ населенных пунктов составляет 122,9 км. Паспортизация и диагностика дорог проведена, схемы организации дорожного движения актуализированы. Не соответствуют нормативным требованиям 57,6 км дорог (46,8 %). Имеется 6 железобетонных мостовых сооружений, 1 находится в аварийном состоянии, по итогам проведенной паспортизации и диагностики мостов (разработка ПСД на капитальный ремонт запланирована на 2024г.)

А/д вне границ населенных пунктов

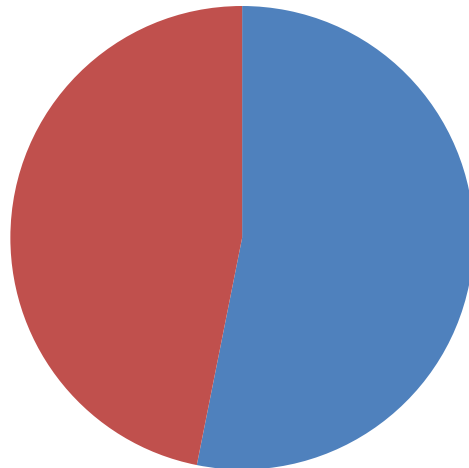


- Соответствуют нормативным требованиям - 65,3 км
- Не соответствуют нормативным требованиям - 57,6 км

На ремонт дорог вне границ населенных пунктов на 2023 год выделено 14 562,3 тыс. рублей. Средства полностью законтрактованы по переходящим контрактам. Кассовое исполнение за 11 месяцев 2023 года составляет 14 562,3 тыс. рублей. В 2023 году завершён ремонт участков дорог «Шемурша - Чепкас-Никольское - Красный Ключ», «Шемурша - Новая Шемурша - Большое Буяново». Протяженность отремонтированных участков – 3,16 км. Подрядные организации – ООО «Эльбрус», ИП Макаров А.Н.

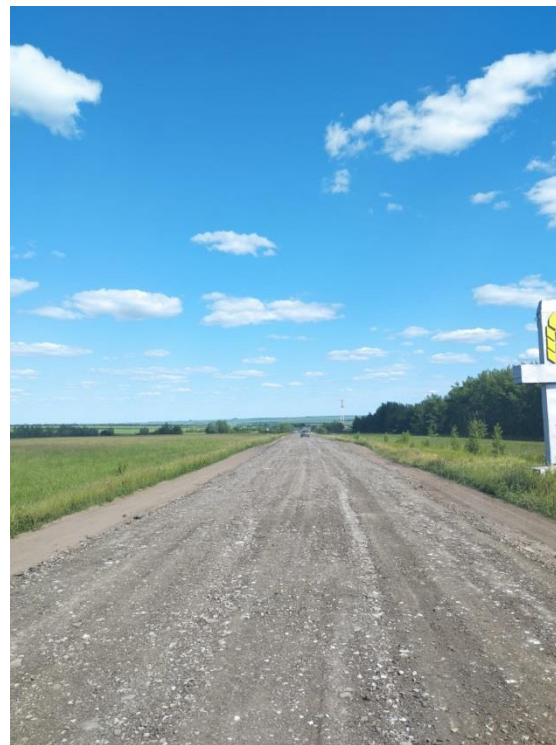


- На сегодняшний день протяженность дорог вне границ населенных пунктов, не соответствующих нормативным требованиям, составляет 57,6 км (46,8 %).
- За 2017-2023 годы выполнен ремонт около 28 километров дорог вне границ населенных пунктов.
- На 2024-2027 планируется ремонт наиболее поврежденных участков дорог вне границ населенных пунктов в рамках выделенных субсидий 3-х годовичными контрактами.

Ремонт а/д вне границ населенных пунктов, км

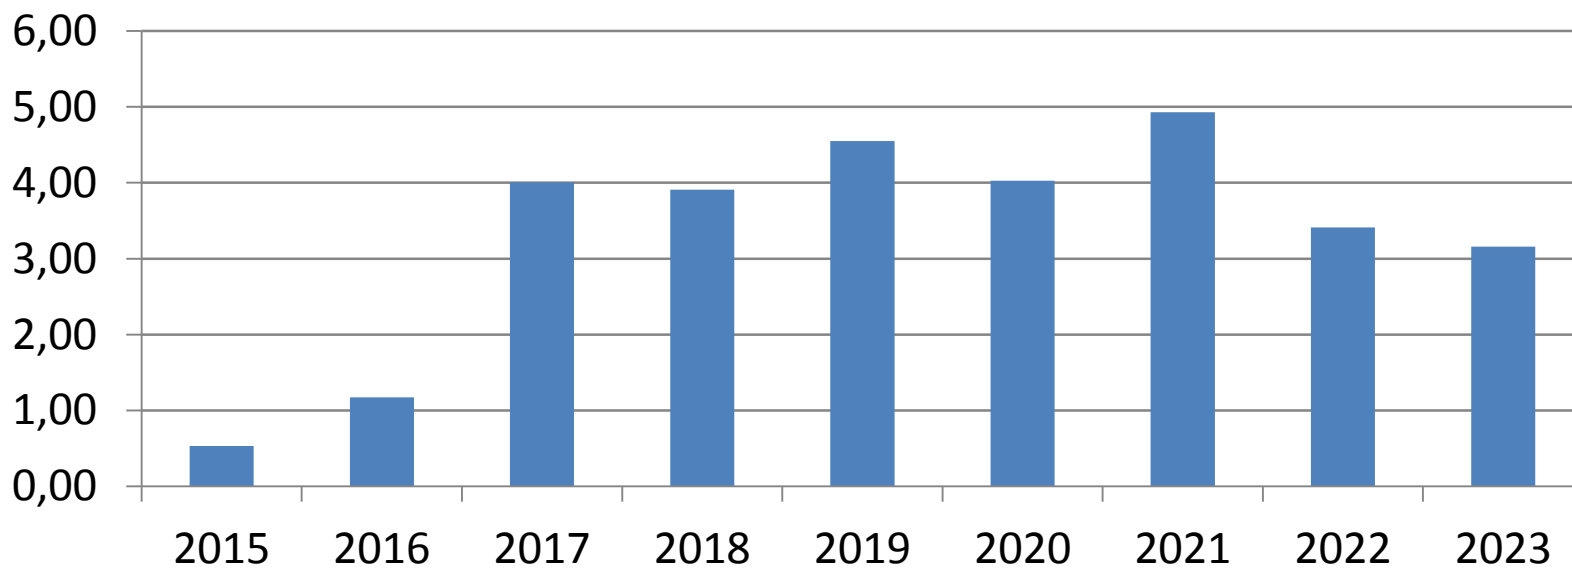

Протяженность дорог местного значения в границах населенных пунктов составляет 129,4 километров, из них – 91,8 км с твердым покрытием, в том числе 64,5 км – с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, не соответствует нормативным требованиям всего дорог – 101,2 км (78,2 %). Паспортизация дорог в границах населенных пунктов проведена. Необходимо провести диагностику дорог и мостовых сооружений, разработку схем организации дорожного движения.

А/д в границах населенных пунктов

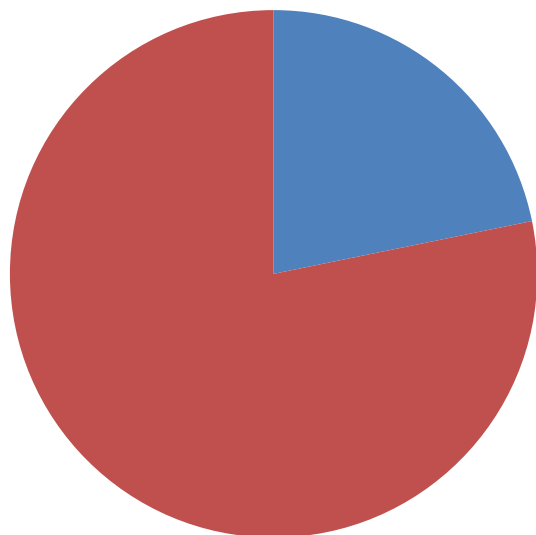


- Соответствуют нормативным требованиям - 28,2 км
- Не соответствуют нормативным требованиям - 101,2 км

- На ремонт дорог в границах населенных пунктов на 2023 год выделено 8 432,2 тыс. рублей. Все средства законтрактованы в 22 году в рамках 3-х годовичных контрактов, большая часть контрактов завершены досрочно. Кассовое исполнение на сегодняшний день составляет 8 432,2 тыс. рублей. Протяженность отремонтированных участков – 2,12 км. Подрядные организации – ООО «Эльбрус», ИП Макаров А.Н., ООО «Трасса-21».




- Протяженность дорог в границах населенных пунктов, несоответствующих нормативным требованиям, составляет 101,2 км (78,2%).
- За 2018 – 2023 годы выполнен ремонт около 5,4 километров дорог в границах населенных пунктов.
- На 2024-2027 планируется ремонт наиболее поврежденных участков дорог в границах населенных пунктов в рамках выделенных субсидий 3-х годовичными контрактами.


Ремонт а/д в границах населенных пунктов, км

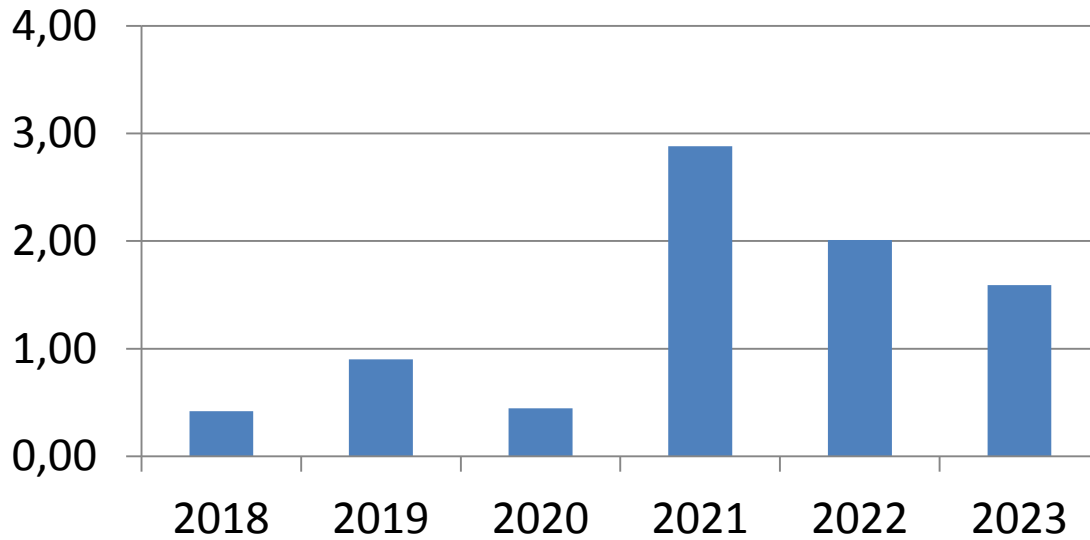

- Жители округа активно поддерживают программу инициативного бюджетирования в части ремонта дорог в населенных пунктах, за 2023 год отремонтировано асфальтобетоном более 2,1 км улично-дорожной сети, около 2,2 км так же выполнен ремонт грунтовых дорог с устройством щебенчатого покрытия, Всего с начала программы инициативного бюджетирования отремонтировано 21,2 км грунтовых дорог, 5,2 км дорог с асфальтобетонным покрытием.

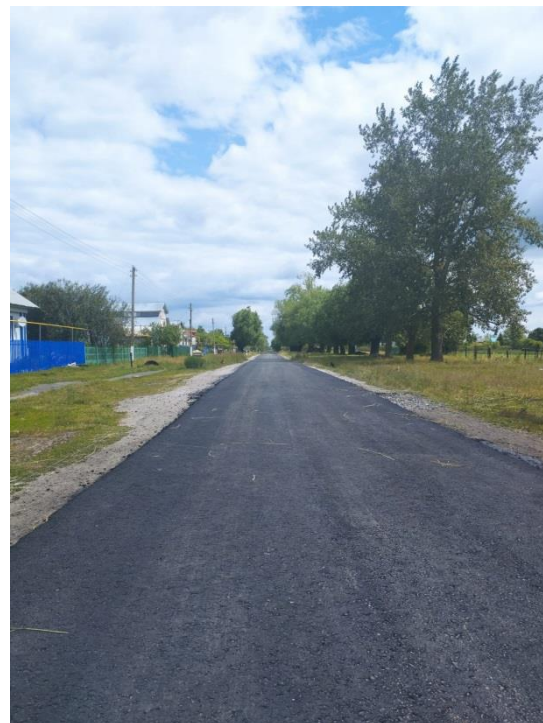

- На 2024 год в Минсельхоз Чувашии направлены проекты на ремонт асфальтобетоном улично-дорожной сети населенных пунктов в рамках инициативного бюджетирования протяженностью около 3,0 км, а так же на ремонт грунтовых дорог щебнем протяженностью около 4,5 км.

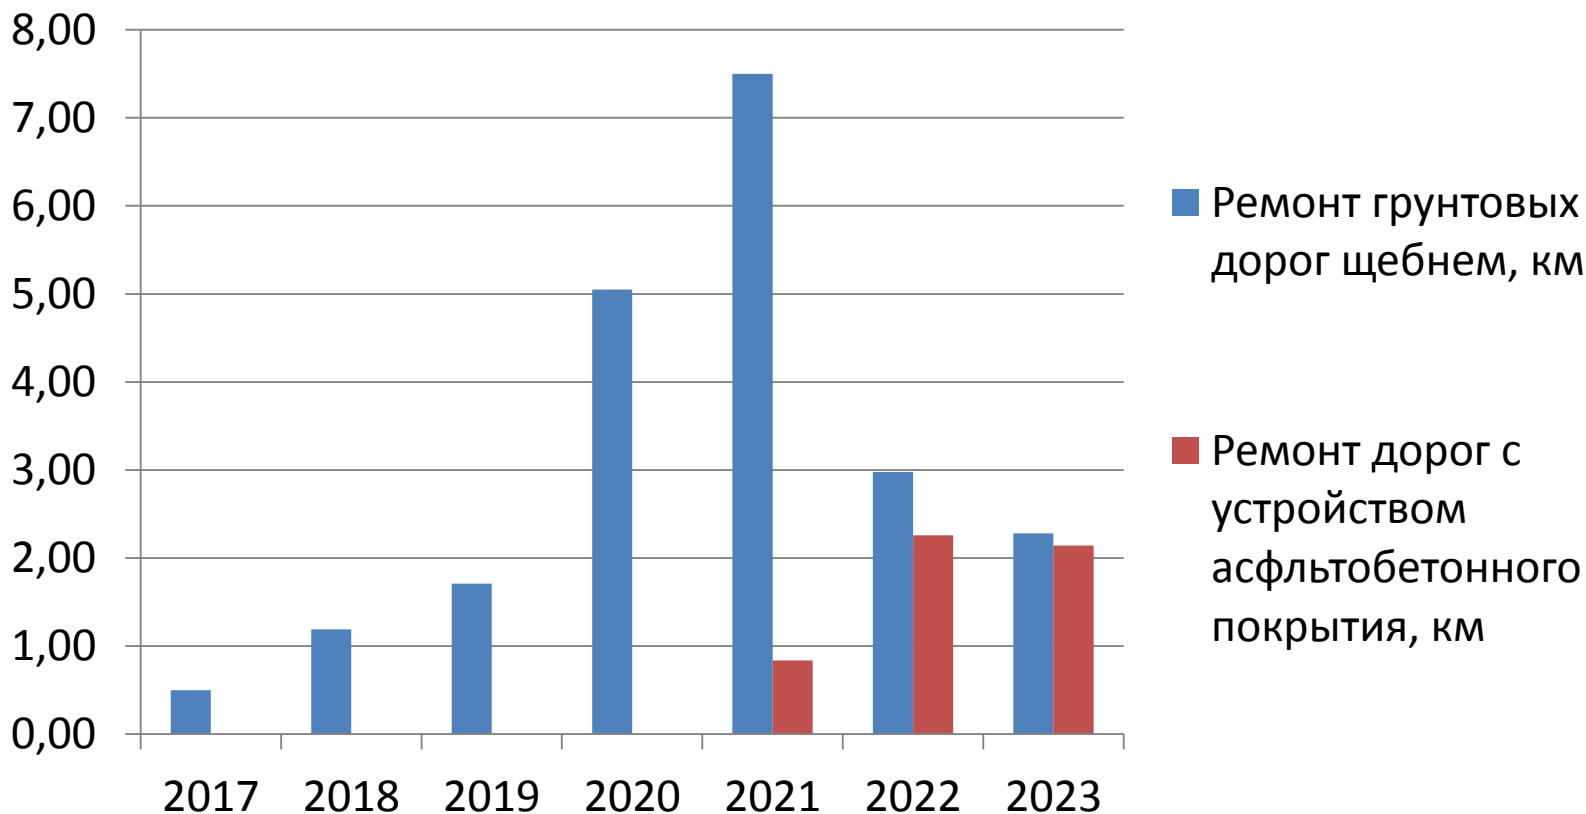

Планы дорожных работ на 2024-2027 гг.

На 2024-2027 года планируется ремонт дорог местного значения:

- Трехбалтаево-Байдераково – Яманчуринский-Карьер с км 0+470 по км 1+620;
- Шемурша – Чепкас-Никольское – Красный Ключ с км 16+270 по км 17+650;
- Шемурша – Новая Шемурша – Большое Буяново с км 6+427 по км 7+430;
- Шемурша - Бичурга-Баишево – Мордовские Тюки – Баскаки – Муллина с км 0+600 по км 2+600;
- Цивильск – Ульяновск – Трехизб-Шемурша – Малое Буяново с км 3+330 по км 3+725;
- Ул. Карла Маркса, Западная, Шоссейная, Красный Бор в с.Шемурша;
- Ул.Победы в д.Карабай-Шемурша;
- Ул. Чапаева в д.Новое Буяново;
- Ул. Ленина в д.Трехизб-Шемурша;
- Ул.Советская, Ленина в д.Верхнее Буяново;
- Ул. Карла Маркса в д.Нижнее Буяново;
- Ул.Совесткая, Ленина в с.Трехбалтаево;
- Ул.Новая в д.Байдераково;
- Ул. Чапаева, Ленина в д.Чепкас-Никольское;
- Ул. Терешковой в д.Чепкас-Ильметьево;
- Ул. Лесная, Гагарина в д.Андреевка;
- Ул. Романа Козлова в д.Асаново
- Ул.Мичурина в с.Бичурга-Баишево;
- Ул.Партизанская, Советская в д.Старые Чукалы;
- Ул. Ленина в д.Новые Чукалы;
- Ул.Ленина в д.Русские Чукалы.
