



УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации Аликовского  
муниципального округа  
Чувашской Республики  
Терентьев А. Ю.

«05» августа 2024 г.

**Карточка проекта «Оптимизация процесса установки и настройки программного обеспечения компьютеров территориальных отделов Аликовского муниципального округа Чувашской Республики»**

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик проекта:** Глава администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики-Терентьев А.Ю.

**Периметр проекта:** Администрация Аликовского муниципального округа (Сектор цифрового развития и информационных технологий), территориальные отделы.

**Границы процесса:** от обнаружения неисправности оргтехники до проверки работоспособности оргтехники.

**Владелец процесса:** заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа Григорьев В.В.

**Руководитель проекта:** управляющий делами - начальник отдела организационно - контрольной и кадровой работы Васильев В.С.

**Команда проекта:**

1. Григорьев Владислав Вячеславович – заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа;
2. Юдин Дмитрий Александрович - ведущий специалист-эксперт цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа
3. Начальники территориальных отделов.

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** Неподготовленность рабочего места специалиста для исполнения должностных обязанностей: выдача справок; оказание муниципальных услуг населению; подготовка документов.

**Проблемы:**

1. Отсутствие программного продукта по удаленному доступу к компьютеру специалистов территориальных отделов.
2. Расход времени специалиста территориальных отделов на подвоз оргтехники в сектор цифрового развития и информационных технологий.
3. Расход средств на заправку автотранспорта на подвоз и вывоз оргтехники.
4. Возможность дополнительных поломок оргтехники во время транспортировки.

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса установки и настройки ПО компьютеров тер.отделов, минут	2559	46
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	80,3	

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 05.08.2024
2. Диагностика и целевое состояние – от 05.08.2024 – 15.10.2024
  - Разработка текущей карты процесса – до 05.09.2024
  - Разработка целевой карты процесса – до 05.10.2024
  - Реализация плана мероприятий – 15.10.2024
3. Kick-off – 01.11.2024
4. Внедрение улучшений – до 18.12.2024
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 27.12.2024

Эксперт Республиканского центра компетенций  
В сфере внедрения технологий бережливого  
Управления в государственном секторе экономики

Епифанова Т.М.


Руководитель проекта - управляющий делами - начальник  
отдела организационно - контрольной и кадровой работы  
Аликовского муниципального округа  
Чувашской Республики

Васильев В.С.



**Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса установки и настройки программного обеспечения компьютеров территориальных Отделов Аликковского муниципального округа Чувашской Республики»**

Длительность процесса	Время ожидания, мин																				Итого время ожидания, часов	Итого время выполнения, часов
	5	3	120	3	5	40	480	3	3	3	120	10	3	3	1440	40	5	5	5			
Время выполнения, мин	5	3	10	3	5	40	240	3	3	3	10	3	3	3	5	40	5	5	5			
Итого время ожидания, часов																					36	
Итого время выполнения, часов																						6,5

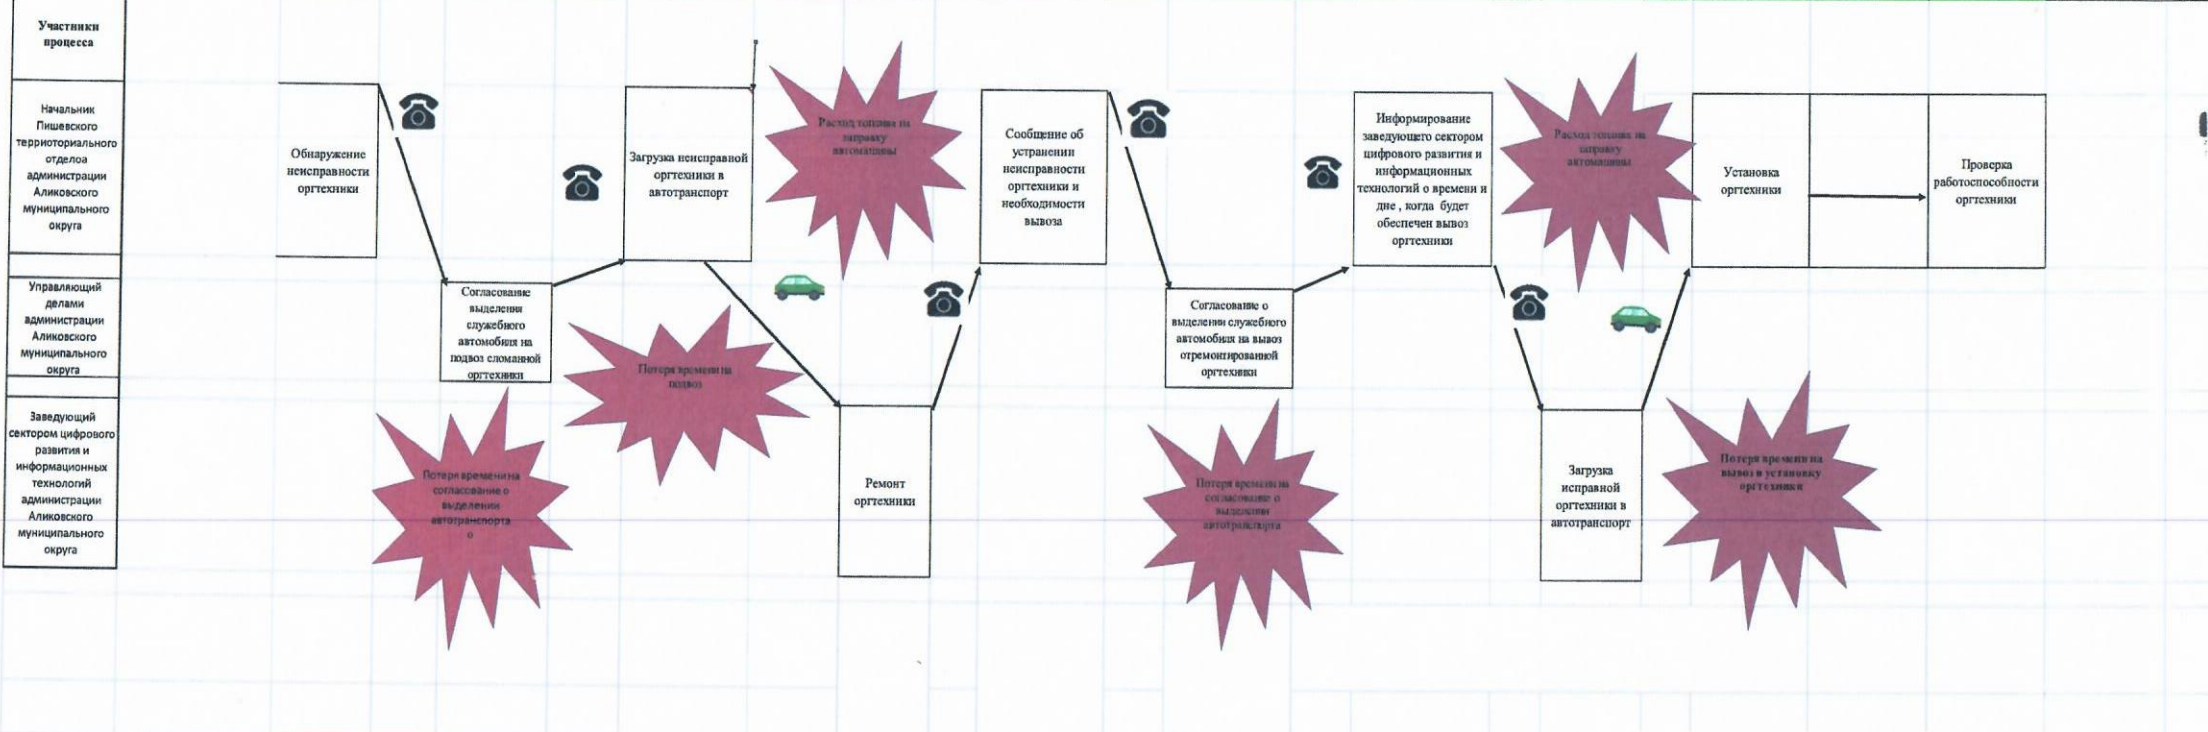

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

*[Handwritten signature]*

Египанова Т.М.

Руководитель проекта - управляющий делами - начальник  
отдела организационно - контрольной и кадровой работы:  
Аликковского муниципального округа  
Чувашской Республики


*[Handwritten signature]*  
Васильев В.С.

УТВЕРЖДАЮ  
 Глава администрации Аликковского  
 муниципального округа  
 Чувашской Республики  
 Терентьев А. Ю.

2024 г.



Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса установки и настройки программного обеспечения компьютеров территориальных отделов Аликковского муниципального округа Чувашской Республики»

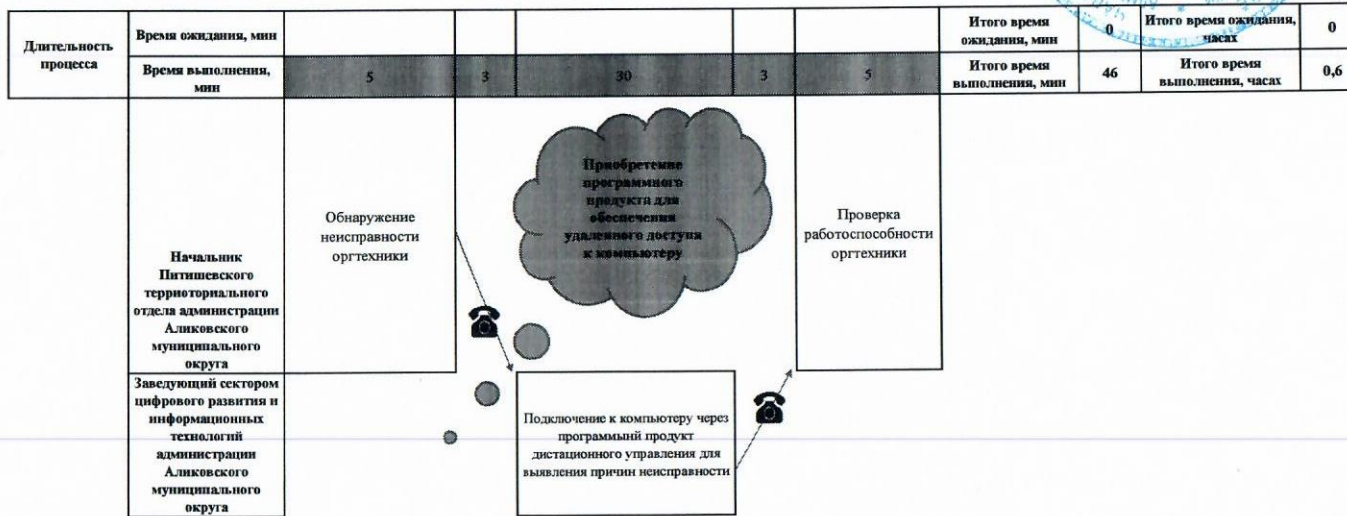

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

Епифанова Т.М.

Руководитель проекта - управляющий делами - начальник  
 отдела организационно - контрольной и кадровой работы  
 Аликковского муниципального округа  
 Чувашской Республики

Васильев В.С.


Утверждаю  
 Глава администрации  
 Аликковского муниципального округа  
 А.Ю.Терентьев  
 05 августа 2024 г.  
 (дата)




**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
 по реализации проекта «Оптимизация процесса установки и настройки программного обеспечения компьютеров территориальных отделов  
 Аликковского муниципального округа Чувашской Республики»»

N п п	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий												
					Октябрь 2024 г.		Ноябрь 2024				Декабрь 2024 г.						
					3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Отсутствие программного продукта по удаленному доступу к компьютеру специалистов территориальных отделов	Приобретение программного продукта для обеспечения удаленного доступа к компьютеру	Приобретен программный продукт для обеспечения удаленного доступа к компьютеру	Григорьев В.В.													
2	Расход времени специалиста территориальных отделов на подвоз оргтехники в сектор цифрового развития и информационных технологий																
3	Расход средств на заправку автотранспорта на подвоз и вывоз оргтехники																
4	Возможность дополнительных поломок оргтехники во время транспортировки.																

Эксперт Республиканского Центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

 Епифанова Т.М.

Руководитель проекта  
  
 (подпись) (инициалы, фамилия)
